

écoutevoir

DOKUMENTATIONSMAPPE


KUNST AM BAU
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT AALEN
ERSATZBAU FÜR AUGENOPTIK UND HÖRAKUSTIK

CARINE DOERFLINGER
2011



4.08.2010 Gewinn des Wettbewerbs
Es handelt sich um ein gerastertes Foto „écoutevoir“ 7,58 x 3,04 m.
Die schwarzen Punkte werden die Farbe der Wand haben (dunkles Betongrau),
die weiße Fläche wird mit Wandfarbe Caparol ausgeführt

Als Info: die Fotolinse hat eine andere Schärfe als unsere Augen, deshalb erscheint die Arbeit auf den Fotos immer scharf, obwohl das in Wirklichkeit durch die Rasterung nicht der Fall ist.

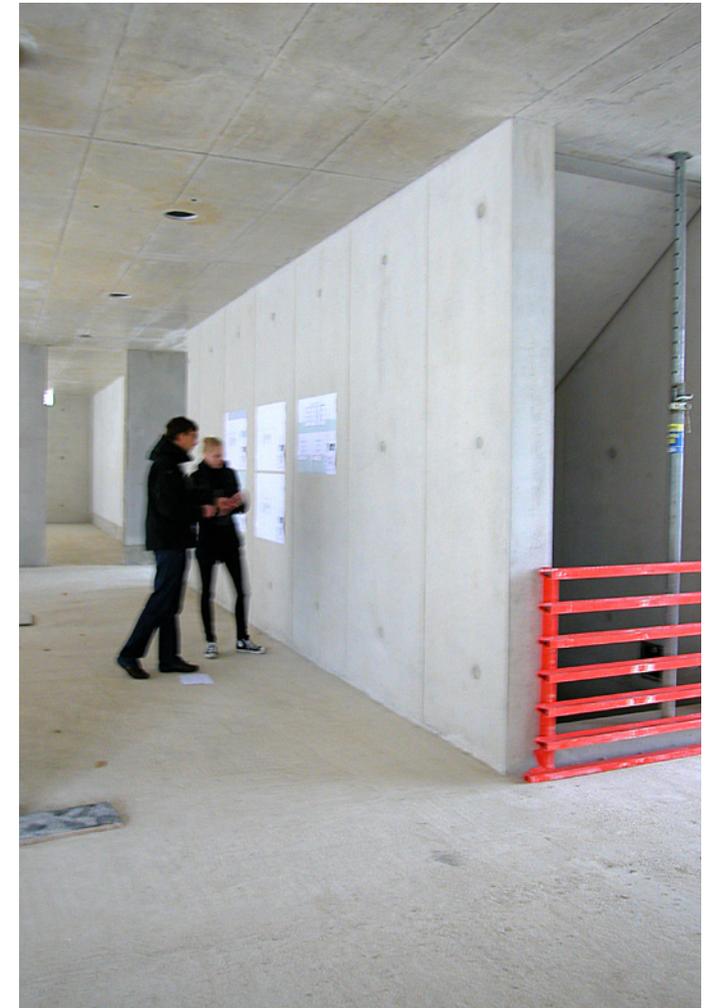


19.10.2010 Richtfest: Erste Begegnung mit der Wand und dem Gebäude, Besprechung mit dem Stukkateur und dem Beschichter (Druckschablonen)



27.07.2011: erste Papierprobe, um die Punktgröße festzulegen. Der Abstand, um das gesamte Bild zu sehen war ca. 15m, deshalb habe ich 3 weitere Papierproben mit unterschiedlichen Punktgrößen machen lassen



10.08.2011: erneute Papierprobe, um die Punktgröße festzulegen. Der Punktabstand wurde kleiner festgelegt (4,2 cm)

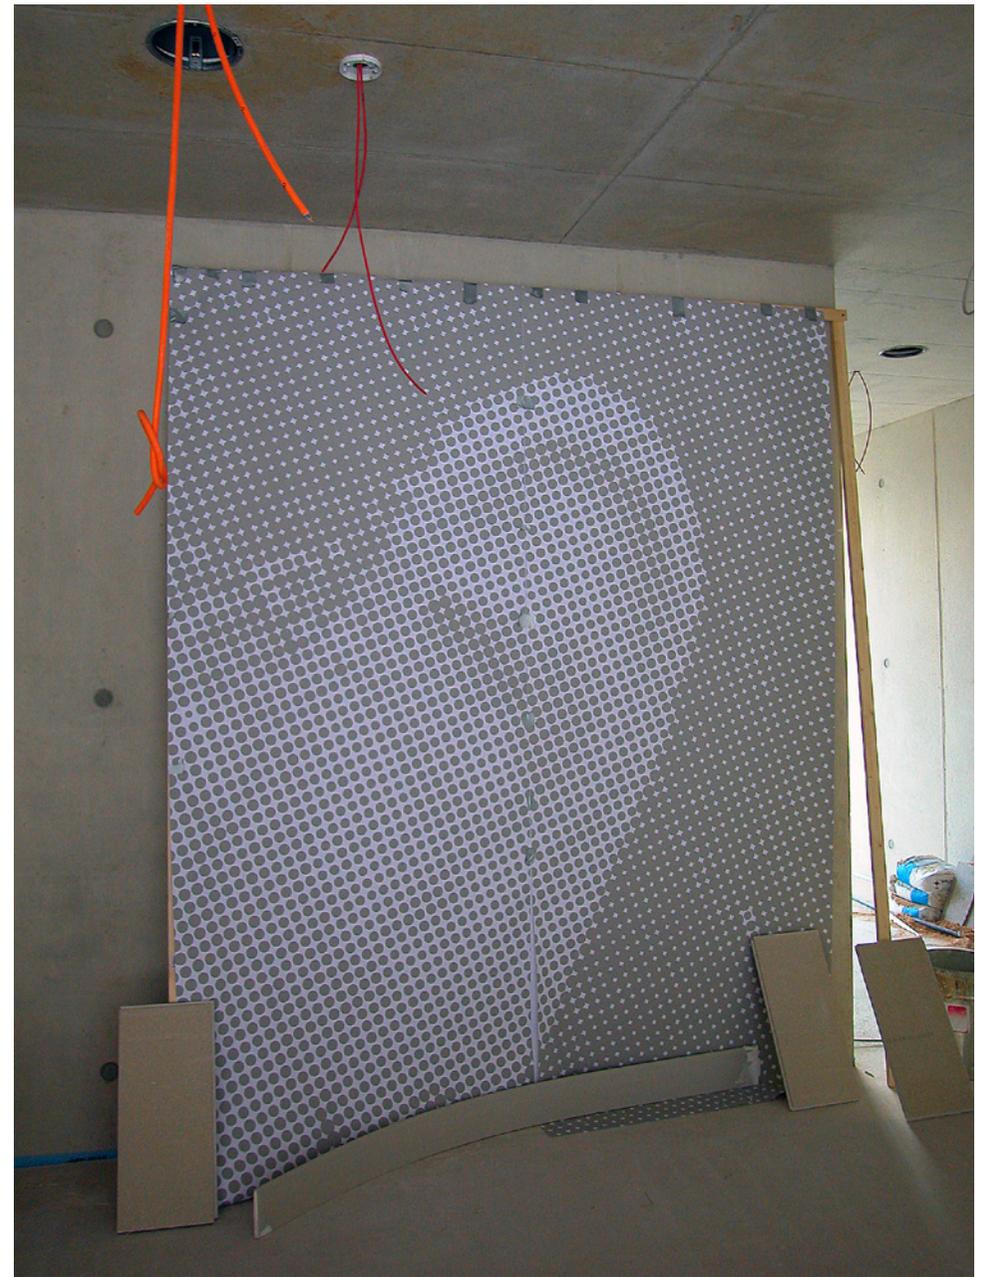


20.09.2011: erneute Papierprobe mit einem größeren Muster und Entscheidung, es mit dieser Punktgröße und Punktabstand auszuführen



28.10 2011: Die Wand war mit durchgefärbter FK-Spachtelmasse fertig
05.11.2011: Egalisationsanstrich auf der verspachtelten Wand



07.11.2011: Die Firma Eicher beginnt und klebt die Schablone zuerst nur einseitig (gelbe Seite)
Weil die Räume zu kalt waren (Türen noch nicht eingebaut) konnte sie nicht gleich die 2. Schicht (weiß) wegmachen

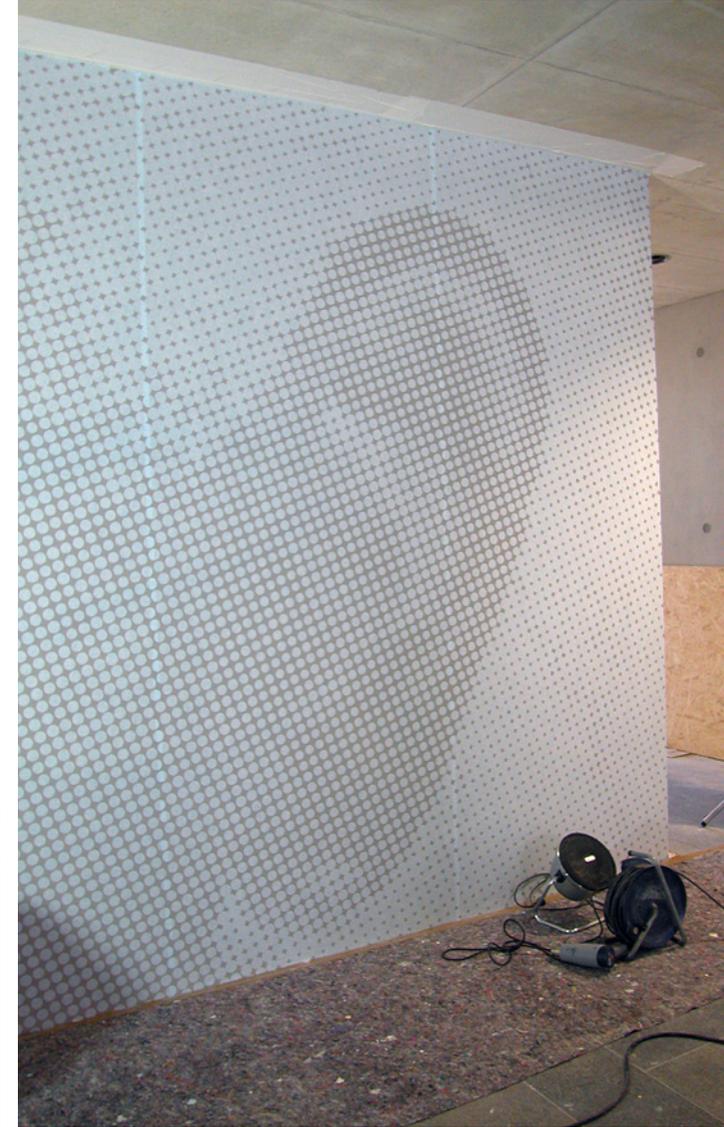

08.11.2011: Die weiße Folie wurde mühsam weggemacht, danach waren die Punkte (als Negativ) zu sehen





08.11.2011: Voranstrich mit grauer Farbe, damit die weiße Farbe nicht unter die Punkte laufen kann

09.11.2011: Zweifacher Anstrich mit weißer Farbe



...und als es trocken war haben wir gleich alle Kreispunkte weggemacht mit Hilfe kleiner Cutter und so erscheint das Bild nach und nach

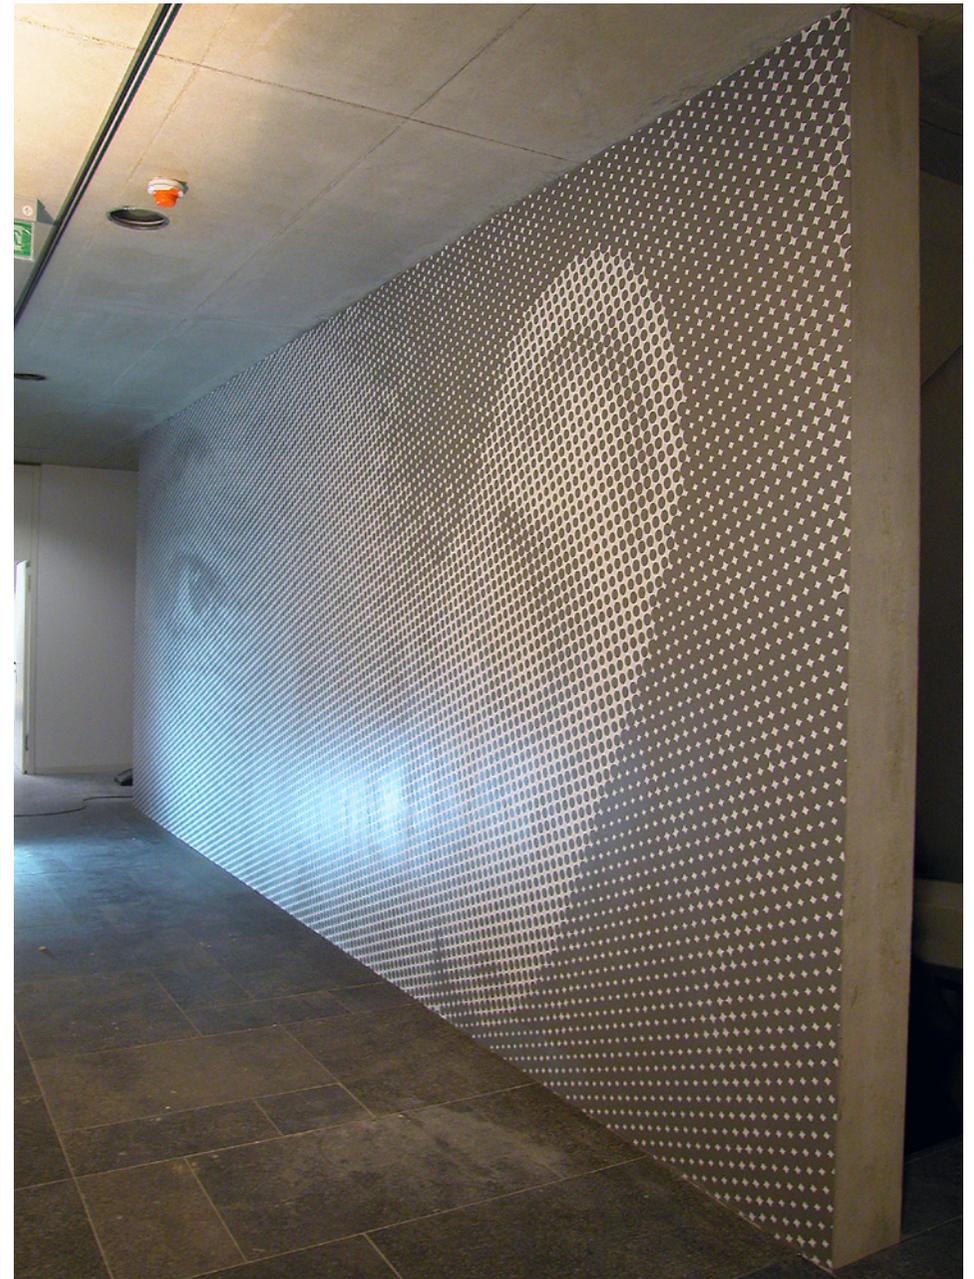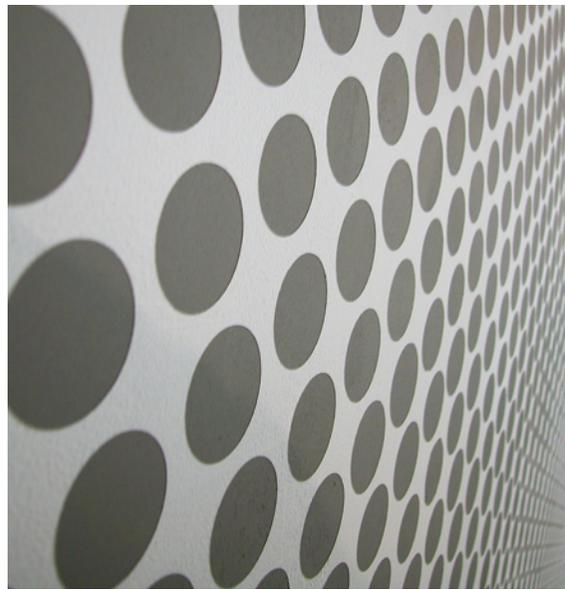

10.11.2011: Alle Punkte sind weg und der zweifache Schutzlack ist aufgebracht: die Arbeit ist fertig



11.11.2011: Beginn der Leuchteninstallation durch den GU und Schutz mit Baustellenabsperungen, bis der Umzug vorbei ist



03.12.2011: Abholung der Bauabspernung, leider war die neue Beleuchtung nicht in Betrieb
